

INFORME FINAL DE PRUEBA DE TRAZABILIDAD

Piedrahita Conect - Logistik Plasencia / Urbanización Pasaderas de Arriba



Imagen de obra: montaje de vivienda prefabricada en Pasaderas de Arriba, Piedrahita.

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Periodo operativo	16/06/2026 09:34 - 19/06/2026 11:35	Piezas consolidadas	29
Lecturas consolidadas	828	Transportes planificados	5 camiones
Origen operativo	Logistik Plasencia	Destino operativo	Urbanización Pasaderas de Arriba, Piedrahita
Ruta de referencia	136 km por carretera: A-66 + N-110	Volumen planificado	43,34 m³

Criterio horario: todos los registros se presentan en horario operativo corregido (+2 h respecto al horario central de los lectores).

Índice de contenidos

1. Resumen ejecutivo
2. Objeto, alcance y criterios de cierre
3. Plan de transportes incorporado
4. Trackeo del camión y reconstrucción logística
5. Métricas globales de la prueba
6. Cronología operativa
7. Análisis operativo de resultados
8. Instalación y certificación digital
9. Incidencias operativas y acciones correctivas
10. Inventario maestro de piezas
11. Lecturas y rendimiento por pieza
12. Fichas individuales de pieza
13. Conclusiones y recomendaciones
14. Anexos técnicos

1. Resumen ejecutivo

La prueba consolida 828 lecturas y 29 piezas prefabricadas entre el 16/06/2026 a las 09:34 y el 19/06/2026 a las 11:35. La operación cubre registros de fábrica, preparación logística, transporte, recepción en obra, montaje, validación y certificación documental de piezas en la urbanización Pasaderas de Arriba, en Piedrahita.

El origen operativo se fija en Logistik Plasencia y el destino operativo en Urbanización Pasaderas de Arriba, Piedrahita. Las lecturas próximas a ambos enclaves se agrupan en su punto operativo correspondiente para permitir una lectura coherente del flujo logístico y constructivo.

El resultado confirma que la trazabilidad por pieza permite convertir cada elemento prefabricado en un activo verificable, con presencia registrada en origen y/o destino, relación con su transporte, estado de montaje y cierre de certificación.

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Piezas trackeadas de principio a fin	10	Piezas trackeadas en llegada a obra, montaje y certificación	15
Piezas trackeadas en fábrica y certificación	4	Piezas certificadas	29
Lecturas en Logistik Plasencia	432	Lecturas en Piedrahita obra	396
Lectores considerados	4	Duración operativa total	74 h 01 min aprox.

2. Objeto, alcance y criterios de cierre

Objeto: documentar la prueba de trazabilidad de piezas prefabricadas de hormigón, identificando resultados operativos, comportamiento de lectura, reconstrucción de transportes, estado de montaje, incidencias y cierre de certificación.

Alcance: registros asociados al proyecto Piedrahita Conect, piezas de los cinco camiones planificados, lectores activos, ubicación normalizada, trazabilidad del camión, montaje en obra, incidencias y fichas de pieza.

2.1 Normalización aplicada

- Se aplica corrección horaria de +2 h a todos los registros de lectura.
- Las lecturas cercanas al origen se reasignan a Logistik Plasencia.
- Las lecturas cercanas al destino se reasignan a Urbanización Pasaderas de Arriba, Piedrahita (Ávila).
- La ruta representada corresponde a carretera real: A-66 + N-110.
- Cuando no existe lectura completa de salida/llegada, la lectura logística se reconstruye a partir de los hitos disponibles y notas operativas.
- Para piezas sin salida de fábrica monitorizada, el inicio de instalación se toma como primera lectura en obra y el fin como siguiente lectura con diferencia mínima de 30 minutos.
- Las piezas del camión 5 se consideran certificadas el 22/06/2026, sin detallar hora.

3. Plan de transportes incorporado

La planificación de cargas organiza la prueba en cinco camiones entre el 16 y el 19 de junio. Los viajes 1 y 2 se registran de inicio a fin. El viaje 3 dispone de recepción en obra. Los viajes 4 y 5 quedan corregidos al 19/06/2026 y no incorporan hora de descarga específica.

Camión	Día	Uds	m³	Piezas	Control	Jornada operativa
1	16/06/2026	6	6,70	399, 400, 401, 402, 403, 404	inicio-fin	5 h 01 min
2	17/06/2026	4	10,10	405, 406, 407, 408	inicio-fin	3 h 38 min
3	18/06/2026	7	9,76	409, 410, 411, 412, 413, 414, 415	recepción en obra	36 min
4	19/06/2026	8	6,68	416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423	recepción en obra	ND
5	19/06/2026	4	10,10	424, 425, 426, 427	solo fábrica	ND

Nota: no se consideran tiempos de tránsito hasta fábrica ni retorno de obra. La jornada se calcula únicamente con hitos registrados dentro de la prueba.


3.1 Detalle técnico de cargas

Camión	Día	Elemento	Material	Unds	Largo	Alto	Ménsula	Espesor	m³
1	16/06/2026	F0.01	H. blanco	1	6,280	0,870	-	0,120	0,66
1	16/06/2026	F0.02	H. blanco	1	6,280	0,870	-	0,120	0,66
1	16/06/2026	F0.03	H. blanco	1	10,540	0,870	10,540	0,160	1,47
1	16/06/2026	F0.04	H. blanco	1	10,540	0,870	10,540	0,160	1,47
1	16/06/2026	F1.06	H. blanco	1	6,280	2,200	-	0,120	1,23
1	16/06/2026	F1.07	H. blanco	1	6,280	2,200	-	0,120	1,23
2	17/06/2026	FJ.01	H. gris	1	5,960	2,250	-	0,260	2,53
2	17/06/2026	FJ.02	H. gris	3	5,960	2,250	-	0,260	7,58
3	18/06/2026	F1.10	H. blanco	4	2,250	4,100	2,250	0,160	5,92
3	18/06/2026	F1.09	H. blanco	1	1,540	4,100	1,540	0,160	1,01
3	18/06/2026	FJ.03	H. gris	2	5,960	1,540	-	0,260	2,86
4	19/06/2026	F1.01	H. blanco	1	0,710	2,200	-	0,160	0,25
4	19/06/2026	F1.02	H. blanco	1	0,840	2,200	-	0,160	0,30
4	19/06/2026	F1.03	H. blanco	1	0,820	2,200	-	0,160	0,29
4	19/06/2026	F1.04	H. blanco	1	1,250	2,200	-	0,160	0,44
4	19/06/2026	F1.05	H. blanco	1	2,200	2,200	-	0,160	0,77
4	19/06/2026	F1.08	H. blanco	1	10,540	1,310	10,540	0,160	2,21
4	19/06/2026	F1.11	H. blanco	1	6,280	1,900	-	0,120	1,21
4	19/06/2026	F1.12	H. blanco	1	6,280	1,900	-	0,120	1,21
5	19/06/2026	FJ.01	H. gris	1	5,960	2,250	-	0,260	2,53
5	19/06/2026	FJ.02	H. gris	3	5,960	2,250	-	0,260	7,59

4. Trackeo del camión y reconstrucción logística

El camión queda identificado por matrícula 9508 JBY e identificador 470D6EC0602767CF010C. Los viajes 1 y 2 cuentan con secuencia registrada de inicio a fin. El viaje 3 dispone de recepción en obra. Los viajes 4 y 5 se corrigen al 19/06/2026 según la información operativa consolidada.

Viaje	Evento	Fecha / hora corregida	Ubicación	Fuente	Nota
1	Llegada camión a nave	2026-06-16 09:34:02	Logistik Plasencia	Identificador camión	Inicio monitorizado
1	Camión en carga	2026-06-16 10:09:42	Logistik Plasencia	Nota operativa	Carga en nave
1	Salida de nave	2026-06-16 11:23:24	Logistik Plasencia	Nota operativa	Salida logística
1	Llegada a obra	2026-06-16 12:47:57	Piedrahita obra	Identificador camión	Fin tránsito
1	Salida de obra	2026-06-16 14:35:02	Piedrahita obra	Identificador camión	Cierre viaje 1
2	Llegada camión a nave	2026-06-17 07:18:27	Logistik Plasencia	Identificador camión	Inicio monitorizado
2	Salida de nave	2026-06-17 08:09:20	Logistik Plasencia	Nota operativa pieza 408	Salida logística
2	Llegada a obra	2026-06-17 10:15:40	Piedrahita obra	Identificador camión	Fin tránsito
2	Salida de obra	2026-06-17 10:55:59	Piedrahita obra	Nota operativa pieza 408	Cierre viaje 2
3	Llegada a obra	2026-06-18 07:16:58	Piedrahita obra	Nota operativa pieza 409	Solo recepción obra
3	Salida de obra	2026-06-18 07:52:50	Piedrahita obra	Inferencia anotada	Salida estimada por nota
4	Recepción en obra	2026-06-19	Piedrahita obra	Corrección operativa	Sin hora de descarga
5	Viaje asignado	2026-06-19	Fábrica / Logistik	Corrección operativa	Solo fábrica; sin hora de descarga

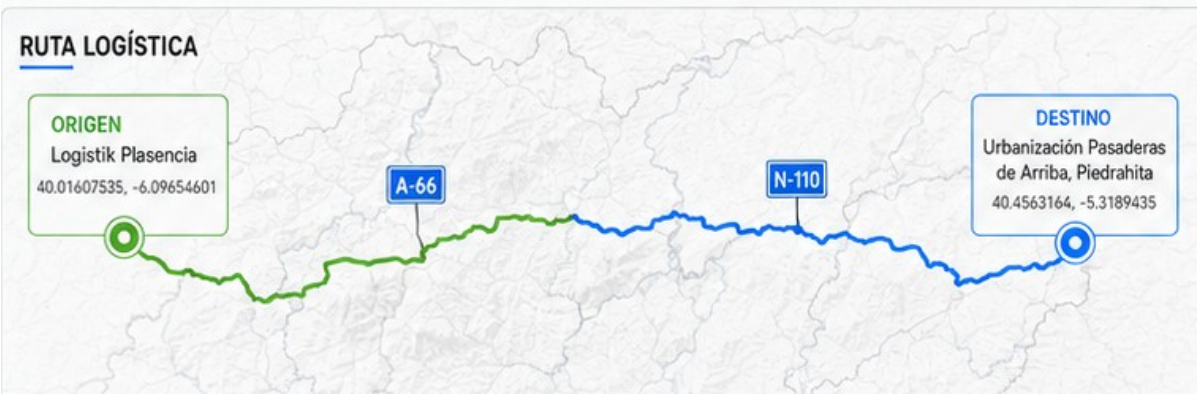


Ruta logística por carretera: Logistik Plasencia - A-66 - N-110 - Piedrahita.

5. Métricas globales de la prueba


Indicador	Valor	Indicador	Valor
-----------	-------	-----------	-------

Lecturas consolidadas	828	Piezas consolidadas	29
Lecturas vinculadas a piezas	788	Eventos complementarios / logística	40
Lecturas Logistik Plasencia	432	Lecturas Piedrahita obra	396
Lectores considerados	4	Hash master	A2F5345C00E1...DD80545C


Lecturas por día

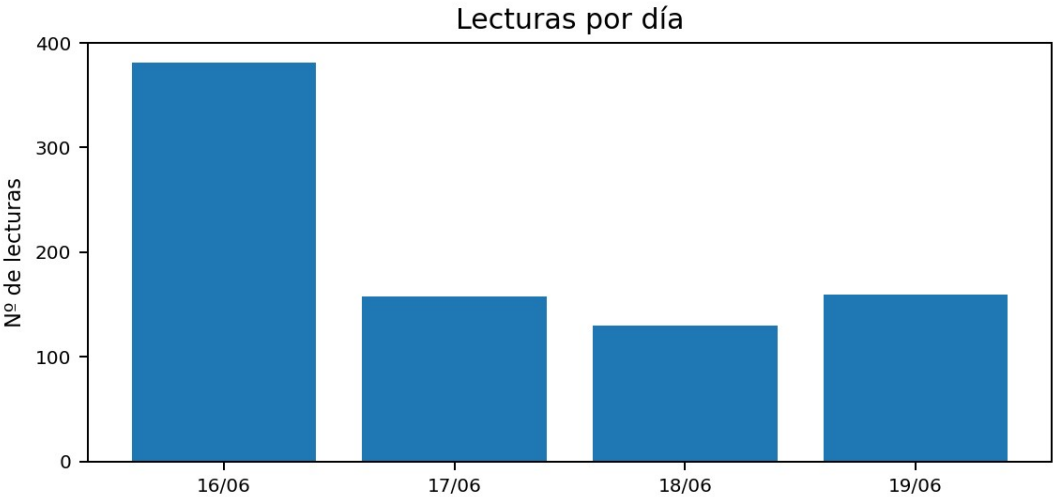


Lecturas por ubicación

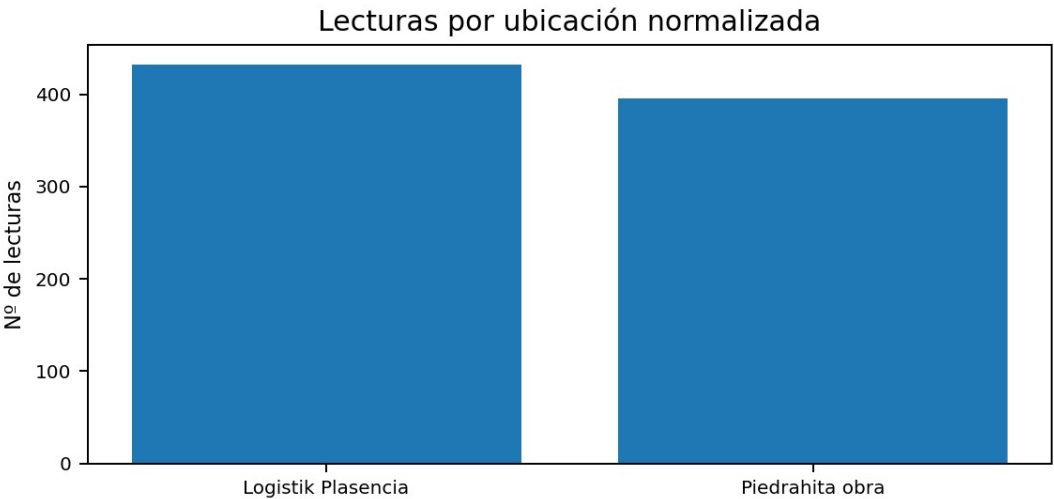

Volumen por camión

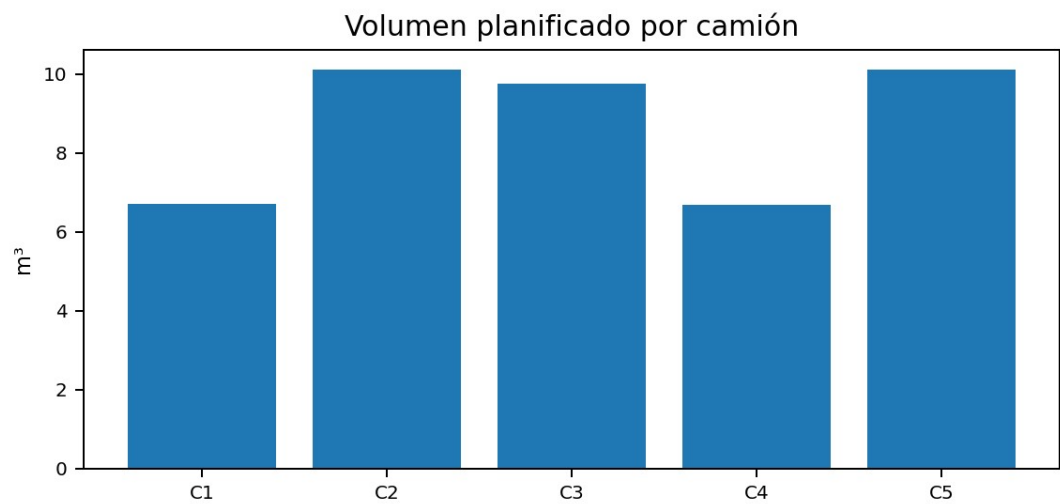

Cobertura de trazabilidad

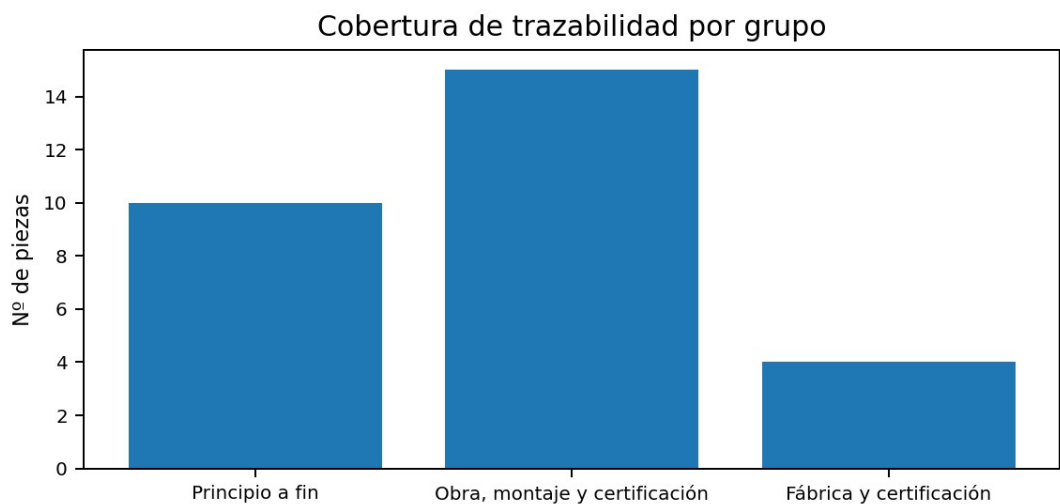

6. Cronología operativa

Día	Lecturas	Piezas	Primer evento	Último evento	Piezas con actividad
16/06/2026	381	18	09:34	13:44	399, 400, 401, 402, 403, 404, 409, 410, 411, 412, 413, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423
17/06/2026	158	14	07:20	11:07	399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 424, 425, 426, 427
18/06/2026	130	17	07:16	13:22	399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
19/06/2026	159	23	08:55	11:35	399, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418...

La lectura temporal muestra concentración de actividad en las fases de preparación/carga, recepción de camión y validación de montaje. El 19/06 concentra el cierre de lectura de obra de una parte significativa del conjunto.

7. Análisis operativo de resultados

7.1 Lectura e identificación

La identificación por pieza se mantiene estable en el dataset depurado. Las lecturas se concentran en ventanas de preparación, carga, recepción y montaje, lo que permite construir un pasaporte operativo por pieza y agrupar eventos por transporte.

7.2 Fábrica - Logistik Plasencia

Logistik Plasencia concentra 432 lecturas normalizadas. Esta fase permite confirmar presencia de piezas, preparación de carga y punto de arranque documental para los activos vinculados al proceso.

7.3 Transporte

Los viajes 1 y 2 disponen de seguimiento de camión desde fábrica hasta obra. En los viajes 3, 4 y 5 se reconstruye la trazabilidad disponible a partir de recepción, estado de fábrica o certificación final.

7.4 Recepción, montaje y validación en obra

Piedrahita obra concentra 396 lecturas. El patrón confirma que la obra funciona como punto de cierre, validación de montaje y certificación por pieza.

7.5 Calidad del dato

El dato final permite consolidar 29 piezas, 5 transportes, 4 lectores considerados, dos ubicaciones operativas normalizadas y un hash master de integridad documental. Los datos no disponibles se mantienen como ND y no se completan mediante hipótesis no registradas.

8. Instalación y certificación digital

Criterio general: para camiones con ciclo completo se considera inicio de instalación la primera lectura en obra posterior a llegada del camión + 1 h. Para piezas sin salida de fábrica monitorizada, se considera inicio de instalación la primera lectura en obra y fin la siguiente lectura con al menos 30 minutos de diferencia. La certificación se toma en la última lectura registrada o, para piezas del camión 5, el día 22/06/2026 sin hora asociada.

Indicador		Valor		Indicador		Valor	
Piezas trackeadas de principio a fin		10		Piezas en llegada a obra, montaje y certificación		15	
Piezas en fábrica y certificación		4		Piezas certificadas		29	
Pieza	Camión	Grupo	Inicio instalación	Fin instalación	Tiempo	Certificación	
399	1	Principio a fin	17/06/2026 10:23	18/06/2026 12:12	25 h 48 min	19/06/2026 · 11:28	
400	1	Principio a fin	17/06/2026 10:23	18/06/2026 12:12	25 h 49 min	19/06/2026 · 11:28	
401	1	Principio a fin	17/06/2026 10:21	18/06/2026 12:12	25 h 50 min	19/06/2026 · 09:00	
402	1	Principio a fin	17/06/2026 10:22	18/06/2026 12:13	25 h 51 min	18/06/2026 · 13:21	
403	1	Principio a fin	17/06/2026 09:29	17/06/2026 10:19	49 min	19/06/2026 · 11:26	
404	1	Principio a fin	17/06/2026 09:37	17/06/2026 10:19	42 min	19/06/2026 · 11:28	
405	2	Principio a fin	18/06/2026 12:11	18/06/2026 13:19	1 h 07 min	19/06/2026 · 11:27	
406	2	Principio a fin	18/06/2026 12:18	18/06/2026 13:19	1 h	19/06/2026 · 11:27	
407	2	Principio a fin	18/06/2026 12:12	18/06/2026 13:19	1 h 07 min	19/06/2026 · 09:00	
408	2	Principio a fin	18/06/2026 12:12	18/06/2026 13:22	1 h 10 min	19/06/2026 · 11:27	
409	3	Obra, montaje y certificación	18/06/2026 07:16	18/06/2026 12:11	4 h 54 min	19/06/2026 · 11:28	
410	3	Obra, montaje y certificación	18/06/2026 07:17	18/06/2026 13:20	6 h 02 min	19/06/2026 · 11:28	
411	3	Obra, montaje y certificación	18/06/2026 07:17	19/06/2026 09:03	25 h 45 min	19/06/2026 · 11:28	
412	3	Obra, montaje y certificación	18/06/2026 07:19	18/06/2026 13:20	6 h 01 min	19/06/2026 · 11:23	
413	3	Obra, montaje y certificación	18/06/2026 07:18	18/06/2026 12:12	4 h 54 min	19/06/2026 · 11:28	
414	3	Obra, montaje y certificación	18/06/2026 07:17	ND	ND	18/06/2026 · 07:19	
415	3	Obra, montaje y certificación	18/06/2026 07:18	19/06/2026 09:03	25 h 45 min	19/06/2026 · 11:30	
416	4	Obra, montaje y certificación	19/06/2026 09:21	19/06/2026 11:27	2 h 06 min	19/06/2026 · 11:28	
417	4	Obra, montaje y	19/06/2026 09:21	19/06/2026 11:35	2 h 14 min	19/06/2026 · 11:35	

		certificación				
418	4	Obra, montaje y certificación	19/06/2026 09:21	ND	ND	19/06/2026 · 09:35
419	4	Obra, montaje y certificación	19/06/2026 09:21	19/06/2026 11:23	2 h 01 min	19/06/2026 · 11:35
420	4	Obra, montaje y certificación	19/06/2026 09:21	19/06/2026 11:24	2 h 03 min	19/06/2026 · 11:26
421	4	Obra, montaje y certificación	19/06/2026 09:21	19/06/2026 11:22	2 h	19/06/2026 · 11:29
422	4	Obra, montaje y certificación	19/06/2026 09:20	19/06/2026 11:22	2 h 01 min	19/06/2026 · 11:29
423	4	Obra, montaje y certificación	19/06/2026 09:20	19/06/2026 11:22	2 h 01 min	19/06/2026 · 11:29
424	5	Fábrica y certificación	ND	ND	ND	22/06/2026
425	5	Fábrica y certificación	ND	ND	ND	22/06/2026
426	5	Fábrica y certificación	ND	ND	ND	22/06/2026
427	5	Fábrica y certificación	ND	ND	ND	22/06/2026

9. Incidencias operativas y acciones correctivas


Fecha	Incidencia	Impacto	Acción recomendada
17/06/2026	Picado de placas por inexistencia de tolerancias	Ajuste de pieza / preparación para encaje	Necesidad de alertas y reglas de tolerancia en diseño y montaje.
18/06/2026	Vuelco de farola completa durante operativa de grúa de obra	Incidencia externa de entorno de obra	Registrar interferencias de grúa y balizar elementos urbanos existentes.
19/06/2026	Rotura de luminaria de farola por parte de grúa de obra	Incidencia externa de entorno de obra	Incorporar revisión previa de interferencias y maniobras críticas.

10. Inventario maestro de piezas

Pieza	Elemento	C	Grupo	Lect.	Únicas	Primer registro	Último registro	m³	T. instalación
399	F0.01	1	Principio a fin	56	48	16/06/2026 09:55	19/06/2026 11:28	0.66	25 h 48 min
400	F0.02	1	Principio a fin	58	52	16/06/2026 09:48	19/06/2026 11:28	0.66	25 h 49 min
401	F0.03	1	Principio a fin	26	22	16/06/2026 09:58	19/06/2026 09:00	1.47	25 h 50 min
402	F0.04	1	Principio a fin	26	26	16/06/2026 10:08	18/06/2026 13:21	1.47	25 h 51 min
403	F1.06	1	Principio a fin	39	36	16/06/2026 10:02	19/06/2026 11:26	1.23	49 min
404	F1.07	1	Principio a fin	29	27	16/06/2026 09:51	19/06/2026 11:28	1.23	42 min
405	J8(2.25)	2	Principio a fin	32	28	17/06/2026 07:20	19/06/2026 11:27	3.67	1 h 07 min
406	J8(2.25)	2	Principio a fin	28	23	17/06/2026 07:25	19/06/2026 11:27	3.67	1 h
407	J8(2.25)	2	Principio a fin	40	34	17/06/2026 07:25	19/06/2026 09:00	3.67	1 h 07 min
408	J8(2.25)	2	Principio a fin	33	29	17/06/2026 07:25	19/06/2026 11:27	3.67	1 h 10 min
409	F1.10	3	Obra, montaje y certificación	74	65	16/06/2026 11:21	19/06/2026 11:28	1.48	4 h 54 min
410	F1.10	3	Obra, montaje y certificación	9	8	16/06/2026 11:22	19/06/2026 11:28	1.48	6 h 02 min
411	F1.10	3	Obra, montaje y certificación	22	20	16/06/2026 11:22	19/06/2026 11:28	1.48	25 h 45 min
412	F1.10	3	Obra, montaje y certificación	25	25	16/06/2026 09:34	19/06/2026 11:23	1.48	6 h 01 min
413	F1.09	3	Obra, montaje y certificación	42	38	16/06/2026 11:21	19/06/2026 11:28	1.01	4 h 54 min
414	J8(1.5)	3	Obra, montaje y certificación	16	15	18/06/2026 07:17	18/06/2026 07:19	1.43	ND
415	J8(1.5)	3	Obra,	12	11	18/06/2026	19/06/2026	1.43	25 h 45 min

			montaje y certificación			07:18	11:30		
416	F1.01	4	Obra, montaje y certificación	33	28	16/06/2026 11:21	19/06/2026 11:28	0.25	2 h 06 min
417	F1.02	4	Obra, montaje y certificación	7	7	16/06/2026 11:22	19/06/2026 11:35	0.3	2 h 14 min
418	F1.03	4	Obra, montaje y certificación	34	34	16/06/2026 10:41	19/06/2026 09:35	0.29	ND
419	F1.04	4	Obra, montaje y certificación	21	19	16/06/2026 11:21	19/06/2026 11:35	0.44	2 h 01 min
420	F1.05	4	Obra, montaje y certificación	13	12	16/06/2026 11:21	19/06/2026 11:26	0.77	2 h 03 min
421	F1.08	4	Obra, montaje y certificación	8	6	16/06/2026 11:22	19/06/2026 11:29	2.21	2 h
422	F1.11	4	Obra, montaje y certificación	10	8	19/06/2026 09:20	19/06/2026 11:29	1.21	2 h 01 min
423	F1.12	4	Obra, montaje y certificación	67	64	16/06/2026 10:41	19/06/2026 11:29	1.21	2 h 01 min
424	J8(2.25)	5	Fábrica y certificación	6	6	17/06/2026 07:36	17/06/2026 07:37	3.67	ND
425	J8(2.25)	5	Fábrica y certificación	6	6	17/06/2026 07:36	17/06/2026 07:37	3.67	ND
426	J8(2.25)	5	Fábrica y certificación	7	7	17/06/2026 07:36	17/06/2026 07:37	3.67	ND
427	J8(2.25)	5	Fábrica y certificación	9	7	17/06/2026 07:36	17/06/2026 07:37	3.67	ND

11. Lecturas y rendimiento por pieza

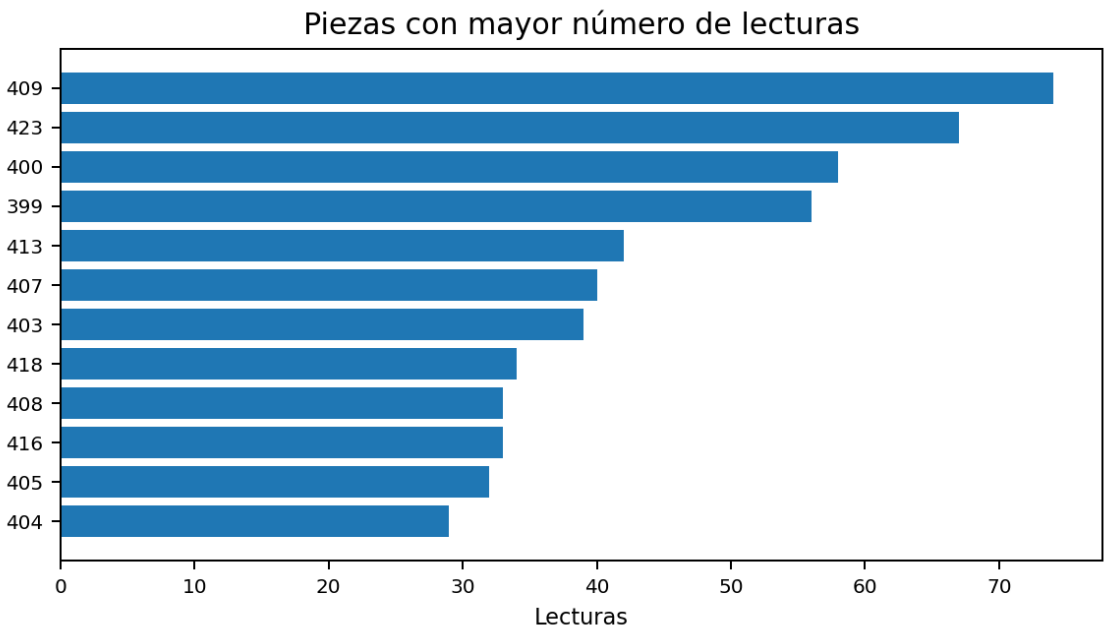

Ranking de piezas con mayor número de lecturas depuradas.

Las piezas con mayor densidad de lectura se asocian a mayor número de verificaciones, múltiples pases por lector o ventanas prolongadas de recepción y montaje.

12. Fichas individuales de pieza

Cada ficha resume identidad, geometría, estado, lecturas, ubicación, tiempos, instalación/certificación y hash de pieza.

Pieza #399 - F0.01

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Principio a fin	Camión	1

Lecturas	56	Lecturas únicas	48
Primer registro	16/06/2026 09:55	Último registro	19/06/2026 11:28
Primera fábrica	16/06/2026 09:55	Primera obra	16/06/2026 13:07
Inicio instalación	17/06/2026 10:23	Fin instalación	18/06/2026 12:12
Tiempo instalación	25 h 48 min	Certificación	19/06/2026 · 11:28
Dimensiones	6.28 x 0.87 x 0.12 m	Volumen	0.66 m³
Ubicaciones	Logistik: 35 / Obra: 21	Hash pieza	B7136BAED847...8388A760
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 09:55	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 09:55	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 11:27	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:27	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #400 - F0.02

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Principio a fin	Camión	1
Lecturas	58	Lecturas únicas	52
Primer registro	16/06/2026 09:48	Último registro	19/06/2026 11:28
Primera fábrica	16/06/2026 09:48	Primera obra	16/06/2026 13:44
Inicio instalación	17/06/2026 10:23	Fin instalación	18/06/2026 12:12
Tiempo instalación	25 h 49 min	Certificación	19/06/2026 · 11:28
Dimensiones	6.28 x 0.87 x 0.12 m	Volumen	0.66 m³
Ubicaciones	Logistik: 29 / Obra: 29	Hash pieza	53403F1A6D7B...6DD28E3F
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 09:48	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 09:49	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 09:49	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 11:22	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:22	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #401 - F0.03

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Principio a fin	Camión	1
Lecturas	26	Lecturas únicas	22
Primer registro	16/06/2026 09:58	Último registro	19/06/2026 09:00
Primera fábrica	16/06/2026 09:58	Primera obra	16/06/2026 13:07
Inicio instalación	17/06/2026 10:21	Fin instalación	18/06/2026 12:12
Tiempo instalación	25 h 50 min	Certificación	19/06/2026 · 09:00
Dimensiones	10.54 x 0.87 x 0.16 m	Volumen	1.47 m³
Ubicaciones	Logistik: 2 / Obra: 24	Hash pieza	C6DEF84E5D50...CBD4D36F
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 09:58	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 09:58	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 13:07	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
...	...	...	...
19/06/2026 09:00	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 09:00	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 09:00	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #402 - F0.04

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Principio a fin	Camión	1
Lecturas	26	Lecturas únicas	26
Primer registro	16/06/2026 10:08	Último registro	18/06/2026 13:21
Primera fábrica	16/06/2026 10:08	Primera obra	16/06/2026 12:45
Inicio instalación	17/06/2026 10:22	Fin instalación	18/06/2026 12:13
Tiempo instalación	25 h 51 min	Certificación	18/06/2026 · 13:21
Dimensiones	10.54 x 0.87 x 0.16 m	Volumen	1.47 m³
Ubicaciones	Logistik: 7 / Obra: 19	Hash pieza	D9FEA82AB799...F57C2908
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 10:08	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 10:08	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 10:41	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-URA4-3ef90f3e209e089b	NRN.LOG-001
...	...	...	...
18/06/2026 12:17	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
18/06/2026 13:21	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
18/06/2026 13:21	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #403 - F1.06

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Principio a fin	Camión	1
Lecturas	39	Lecturas únicas	36
Primer registro	16/06/2026 10:02	Último registro	19/06/2026 11:26
Primera fábrica	16/06/2026 10:02	Primera obra	16/06/2026 12:45
Inicio instalación	17/06/2026 09:29	Fin instalación	17/06/2026 10:19
Tiempo instalación	49 min	Certificación	19/06/2026 · 11:26
Dimensiones	6.28 x 2.2 x 0.12 m	Volumen	1.23 m³
Ubicaciones	Logistik: 6 / Obra: 33	Hash pieza	9BAF282FAEE2...5BB3EED6
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 10:02	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 10:02	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 10:02	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 11:22	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:23	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:26	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #404 - F1.07

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Principio a fin	Camión	1
Lecturas	29	Lecturas únicas	27
Primer registro	16/06/2026 09:51	Último registro	19/06/2026 11:28
Primera fábrica	16/06/2026 09:51	Primera obra	16/06/2026 12:46
Inicio instalación	17/06/2026 09:37	Fin instalación	17/06/2026 10:19
Tiempo instalación	42 min	Certificación	19/06/2026 · 11:28
Dimensiones	6.28 x 2.2 x 0.12 m	Volumen	1.23 m³
Ubicaciones	Logistik: 7 / Obra: 22	Hash pieza	B27F0831A72F...4BC17145
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 09:51	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 09:51	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 09:51	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #405 - J8(2.25)

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Principio a fin	Camión	2
Lecturas	32	Lecturas únicas	28
Primer registro	17/06/2026 07:20	Último registro	19/06/2026 11:27
Primera fábrica	17/06/2026 07:20	Primera obra	17/06/2026 10:15
Inicio instalación	18/06/2026 12:11	Fin instalación	18/06/2026 13:19
Tiempo instalación	1 h 07 min	Certificación	19/06/2026 · 11:27
Dimensiones	6.28 x 2.25 x 0.26 m	Volumen	3.67 m³
Ubicaciones	Logistik: 9 / Obra: 23	Hash pieza	83AEBF86D811...F730D2E3
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
17/06/2026 07:20	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:20	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:38	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 11:24	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:27	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:27	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #406 - J8(2.25)

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Principio a fin	Camión	2
Lecturas	28	Lecturas únicas	23
Primer registro	17/06/2026 07:25	Último registro	19/06/2026 11:27
Primera fábrica	17/06/2026 07:25	Primera obra	17/06/2026 10:15
Inicio instalación	18/06/2026 12:18	Fin instalación	18/06/2026 13:19
Tiempo instalación	1 h	Certificación	19/06/2026 · 11:27
Dimensiones	6.28 x 2.25 x 0.26 m	Volumen	3.67 m³
Ubicaciones	Logistik: 12 / Obra: 16	Hash pieza	A85832AD7C7E...8C4129B4
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
17/06/2026 07:25	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:25	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:38	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 08:59	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:24	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:27	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #407 - J8(2.25)

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Principio a fin	Camión	2
Lecturas	40	Lecturas únicas	34
Primer registro	17/06/2026 07:25	Último registro	19/06/2026 09:00
Primera fábrica	17/06/2026 07:25	Primera obra	17/06/2026 10:16
Inicio instalación	18/06/2026 12:12	Fin instalación	18/06/2026 13:19
Tiempo instalación	1 h 07 min	Certificación	19/06/2026 · 09:00
Dimensiones	6.28 x 2.25 x 0.26 m	Volumen	3.67 m³
Ubicaciones	Logistik: 21 / Obra: 19	Hash pieza	D37F4B0D9E91...018CAFE4
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
17/06/2026 07:25	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:25	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:35	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 08:56	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 09:00	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 09:00	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #408 - J8(2.25)

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Principio a fin	Camión	2
Lecturas	33	Lecturas únicas	29
Primer registro	17/06/2026 07:25	Último registro	19/06/2026 11:27
Primera fábrica	17/06/2026 07:25	Primera obra	17/06/2026 10:16
Inicio instalación	18/06/2026 12:12	Fin instalación	18/06/2026 13:22
Tiempo instalación	1 h 10 min	Certificación	19/06/2026 · 11:27
Dimensiones	6.28 x 2.25 x 0.26 m	Volumen	3.67 m³
Ubicaciones	Logistik: 15 / Obra: 18	Hash pieza	1AB655C19F63...D992DB8E
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
17/06/2026 07:25	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:25	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:30	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 11:27	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:27	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:27	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #409 - F1.10

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	3
Lecturas	74	Lecturas únicas	65
Primer registro	16/06/2026 11:21	Último registro	19/06/2026 11:28
Primera fábrica	16/06/2026 11:21	Primera obra	18/06/2026 07:16
Inicio instalación	18/06/2026 07:16	Fin instalación	18/06/2026 12:11
Tiempo instalación	4 h 54 min	Certificación	19/06/2026 · 11:28
Dimensiones	2.25 x 4.1 x 0.16 m	Volumen	1.48 m³
Ubicaciones	Logistik: 40 / Obra: 34	Hash pieza	3E6A65E713A5...0E59A63B
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 11:27	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #410 - F1.10

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	3
Lecturas	9	Lecturas únicas	8
Primer registro	16/06/2026 11:22	Último registro	19/06/2026 11:28
Primera fábrica	16/06/2026 11:22	Primera obra	18/06/2026 07:17
Inicio instalación	18/06/2026 07:17	Fin instalación	18/06/2026 13:20
Tiempo instalación	6 h 02 min	Certificación	19/06/2026 · 11:28
Dimensiones	2.25 x 4.1 x 0.16 m	Volumen	1.48 m³
Ubicaciones	Logistik: 1 / Obra: 8	Hash pieza	795070E93AB0...4A015122
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 11:22	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
18/06/2026 07:17	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
18/06/2026 13:20	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
...	...	...	...
19/06/2026 11:23	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:27	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #411 - F1.10

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	3
Lecturas	22	Lecturas únicas	20
Primer registro	16/06/2026 11:22	Último registro	19/06/2026 11:28
Primera fábrica	16/06/2026 11:22	Primera obra	18/06/2026 07:17
Inicio instalación	18/06/2026 07:17	Fin instalación	19/06/2026 09:03
Tiempo instalación	25 h 45 min	Certificación	19/06/2026 · 11:28
Dimensiones	2.25 x 4.1 x 0.16 m	Volumen	1.48 m³
Ubicaciones	Logistik: 8 / Obra: 14	Hash pieza	6FAE96703E82...FF386517
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 11:22	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:22	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:22	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 11:27	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:27	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #412 - F1.10

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	3
Lecturas	25	Lecturas únicas	25
Primer registro	16/06/2026 09:34	Último registro	19/06/2026 11:23
Primera fábrica	16/06/2026 09:34	Primera obra	18/06/2026 07:19
Inicio instalación	18/06/2026 07:19	Fin instalación	18/06/2026 13:20
Tiempo instalación	6 h 01 min	Certificación	19/06/2026 · 11:23
Dimensiones	2.25 x 4.1 x 0.16 m	Volumen	1.48 m³
Ubicaciones	Logistik: 20 / Obra: 5	Hash pieza	50CAD4ECF5E7...D911DD3D
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 09:34	LOGISTIK_PLASENCIA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
16/06/2026 09:34	LOGISTIK_PLASENCIA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
16/06/2026 10:39	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-URA4-3ef90f3e209e089b	NRN.LOG-001
...	...	...	...
18/06/2026 13:20	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 08:57	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:23	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #413 - F1.09

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	3
Lecturas	42	Lecturas únicas	38
Primer registro	16/06/2026 11:21	Último registro	19/06/2026 11:28
Primera fábrica	16/06/2026 11:21	Primera obra	18/06/2026 07:18
Inicio instalación	18/06/2026 07:18	Fin instalación	18/06/2026 12:12
Tiempo instalación	4 h 54 min	Certificación	19/06/2026 · 11:28
Dimensiones	1.54 x 4.1 x 0.16 m	Volumen	1.01 m³
Ubicaciones	Logistik: 27 / Obra: 15	Hash pieza	24753078E75E...518D15DA
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 09:01	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:23	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #414 - J8(1.5)

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	3
Lecturas	16	Lecturas únicas	15
Primer registro	18/06/2026 07:17	Último registro	18/06/2026 07:19
Primera fábrica	ND	Primera obra	18/06/2026 07:17
Inicio instalación	18/06/2026 07:17	Fin instalación	ND
Tiempo instalación	ND	Certificación	18/06/2026 · 07:19
Dimensiones	5.96 x 1.54 x 0.26 m	Volumen	1.43 m³
Ubicaciones	Logistik: 0 / Obra: 16	Hash pieza	8248615CC05F...EA7A0B69
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
18/06/2026 07:17	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
18/06/2026 07:17	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
18/06/2026 07:18	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
...	...	...	...
18/06/2026 07:19	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
18/06/2026 07:19	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
18/06/2026 07:19	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #415 - J8(1.5)

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	3
Lecturas	12	Lecturas únicas	11
Primer registro	18/06/2026 07:18	Último registro	19/06/2026 11:30
Primera fábrica	ND	Primera obra	18/06/2026 07:18
Inicio instalación	18/06/2026 07:18	Fin instalación	19/06/2026 09:03
Tiempo instalación	25 h 45 min	Certificación	19/06/2026 · 11:30
Dimensiones	5.96 x 1.54 x 0.26 m	Volumen	1.43 m³
Ubicaciones	Logistik: 0 / Obra: 12	Hash pieza	280ECE74BCDF...0C77A401
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
18/06/2026 07:18	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
18/06/2026 07:18	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
18/06/2026 07:18	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
...	...	...	...
18/06/2026 07:19	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 09:03	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:30	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #416 - F1.01

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	4
Lecturas	33	Lecturas únicas	28
Primer registro	16/06/2026 11:21	Último registro	19/06/2026 11:28
Primera fábrica	16/06/2026 11:21	Primera obra	19/06/2026 09:21
Inicio instalación	19/06/2026 09:21	Fin instalación	19/06/2026 11:27
Tiempo instalación	2 h 06 min	Certificación	19/06/2026 · 11:28
Dimensiones	0.71 x 2.2 x 0.16 m	Volumen	0.25 m³
Ubicaciones	Logistik: 26 / Obra: 7	Hash pieza	0C73CFAFBEB9...DB61A41D
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:28	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #417 - F1.02

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	4
Lecturas	7	Lecturas únicas	7
Primer registro	16/06/2026 11:22	Último registro	19/06/2026 11:35
Primera fábrica	16/06/2026 11:22	Primera obra	19/06/2026 09:21
Inicio instalación	19/06/2026 09:21	Fin instalación	19/06/2026 11:35
Tiempo instalación	2 h 14 min	Certificación	19/06/2026 · 11:35
Dimensiones	0.84 x 2.2 x 0.16 m	Volumen	0.3 m³
Ubicaciones	Logistik: 3 / Obra: 4	Hash pieza	D36DB8D8C671...0210B902
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 11:22	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:22	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:22	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 09:35	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 09:35	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:35	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #418 - F1.03

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	4
Lecturas	34	Lecturas únicas	34
Primer registro	16/06/2026 10:41	Último registro	19/06/2026 09:35
Primera fábrica	16/06/2026 10:41	Primera obra	19/06/2026 09:21
Inicio instalación	19/06/2026 09:21	Fin instalación	ND
Tiempo instalación	ND	Certificación	19/06/2026 · 09:35
Dimensiones	0.82 x 2.2 x 0.16 m	Volumen	0.29 m³
Ubicaciones	Logistik: 30 / Obra: 4	Hash pieza	190509F60027...54E95088
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 10:41	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-URA4-3ef90f3e209e089b	NRN.LOG-001
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 09:21	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 09:35	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 09:35	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #419 - F1.04

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	4
Lecturas	21	Lecturas únicas	19
Primer registro	16/06/2026 11:21	Último registro	19/06/2026 11:35
Primera fábrica	16/06/2026 11:21	Primera obra	19/06/2026 09:21
Inicio instalación	19/06/2026 09:21	Fin instalación	19/06/2026 11:23
Tiempo instalación	2 h 01 min	Certificación	19/06/2026 · 11:35
Dimensiones	1.25 x 2.2 x 0.16 m	Volumen	0.44 m³
Ubicaciones	Logistik: 15 / Obra: 6	Hash pieza	12B2F08AE539...C405DD75
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 11:23	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:35	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:35	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #420 - F1.05

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	4
Lecturas	13	Lecturas únicas	12
Primer registro	16/06/2026 11:21	Último registro	19/06/2026 11:26
Primera fábrica	16/06/2026 11:21	Primera obra	19/06/2026 09:21
Inicio instalación	19/06/2026 09:21	Fin instalación	19/06/2026 11:24
Tiempo instalación	2 h 03 min	Certificación	19/06/2026 · 11:26
Dimensiones	2.2 x 2.2 x 0.16 m	Volumen	0.77 m³
Ubicaciones	Logistik: 5 / Obra: 8	Hash pieza	E17892D39F57...5156AA7B
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:21	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
16/06/2026 11:22	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
19/06/2026 09:35	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:24	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:26	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #421 - F1.08

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	4
Lecturas	8	Lecturas únicas	6
Primer registro	16/06/2026 11:22	Último registro	19/06/2026 11:29
Primera fábrica	16/06/2026 11:22	Primera obra	19/06/2026 09:21
Inicio instalación	19/06/2026 09:21	Fin instalación	19/06/2026 11:22
Tiempo instalación	2 h	Certificación	19/06/2026 · 11:29
Dimensiones	10.54 x 1.31 x 0.16 m	Volumen	2.21 m³
Ubicaciones	Logistik: 1 / Obra: 7	Hash pieza	5BE3220CB016...06F07958
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 11:22	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
19/06/2026 09:21	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 09:36	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
...	...	...	...
19/06/2026 11:29	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:29	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:29	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #422 - F1.11

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	4
Lecturas	10	Lecturas únicas	8
Primer registro	19/06/2026 09:20	Último registro	19/06/2026 11:29
Primera fábrica	ND	Primera obra	19/06/2026 09:20
Inicio instalación	19/06/2026 09:20	Fin instalación	19/06/2026 11:22
Tiempo instalación	2 h 01 min	Certificación	19/06/2026 · 11:29
Dimensiones	6.28 x 1.9 x 0.12 m	Volumen	1.21 m³
Ubicaciones	Logistik: 0 / Obra: 10	Hash pieza	FC06F570B839...83DFA217
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
19/06/2026 09:20	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 09:20	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 09:35	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
...	...	...	...
19/06/2026 11:29	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:29	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:29	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #423 - F1.12

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Obra, montaje y certificación	Camión	4
Lecturas	67	Lecturas únicas	64
Primer registro	16/06/2026 10:41	Último registro	19/06/2026 11:29
Primera fábrica	16/06/2026 10:41	Primera obra	19/06/2026 09:20
Inicio instalación	19/06/2026 09:20	Fin instalación	19/06/2026 11:22
Tiempo instalación	2 h 01 min	Certificación	19/06/2026 · 11:29
Dimensiones	6.28 x 1.9 x 0.12 m	Volumen	1.21 m³
Ubicaciones	Logistik: 59 / Obra: 8	Hash pieza	F5220A778D21...11CD451E
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
16/06/2026 10:41	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-URA4-3ef90f3e209e089b	NRN.LOG-001
16/06/2026 10:41	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-URA4-3ef90f3e209e089b	NRN.LOG-001
16/06/2026 10:41	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-URA4-3ef90f3e209e089b	NRN.LOG-001
...	...	...	...
19/06/2026 11:29	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:29	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005
19/06/2026 11:29	PIEDRAHITA_OBRA	samsung-SM-A165F-1cba69a93cf838d	NRN.LOG-005

Pieza #424 - J8(2.25)

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Fábrica y certificación	Camión	5
Lecturas	6	Lecturas únicas	6
Primer registro	17/06/2026 07:36	Último registro	17/06/2026 07:37
Primera fábrica	17/06/2026 07:36	Primera obra	ND
Inicio instalación	ND	Fin instalación	ND
Tiempo instalación	ND	Certificación	22/06/2026
Dimensiones	6.28 x 2.25 x 0.26 m	Volumen	3.67 m³
Ubicaciones	Logistik: 6 / Obra: 0	Hash pieza	BD0CA048ED31...610D9C89
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
17/06/2026 07:36	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:36	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:36	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002

Pieza #425 - J8(2.25)

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Fábrica y certificación	Camión	5
Lecturas	6	Lecturas únicas	6
Primer registro	17/06/2026 07:36	Último registro	17/06/2026 07:37
Primera fábrica	17/06/2026 07:36	Primera obra	ND
Inicio instalación	ND	Fin instalación	ND
Tiempo instalación	ND	Certificación	22/06/2026
Dimensiones	6.28 x 2.25 x 0.26 m	Volumen	3.67 m³
Ubicaciones	Logistik: 6 / Obra: 0	Hash pieza	3F1320DA587A...712E8D92
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
17/06/2026 07:36	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:36	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:36	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002

Pieza #426 - J8(2.25)

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Fábrica y certificación	Camión	5
Lecturas	7	Lecturas únicas	7
Primer registro	17/06/2026 07:36	Último registro	17/06/2026 07:37
Primera fábrica	17/06/2026 07:36	Primera obra	ND
Inicio instalación	ND	Fin instalación	ND
Tiempo instalación	ND	Certificación	22/06/2026
Dimensiones	6.28 x 2.25 x 0.26 m	Volumen	3.67 m³
Ubicaciones	Logistik: 7 / Obra: 0	Hash pieza	2375FDCE3A5B...EAC39058
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
17/06/2026 07:36	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:36	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:36	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002

Pieza #427 - J8(2.25)

Campo	Valor	Campo	Valor
Grupo	Fábrica y certificación	Camión	5
Lecturas	9	Lecturas únicas	7
Primer registro	17/06/2026 07:36	Último registro	17/06/2026 07:37
Primera fábrica	17/06/2026 07:36	Primera obra	ND
Inicio instalación	ND	Fin instalación	ND
Tiempo instalación	ND	Certificación	22/06/2026
Dimensiones	6.28 x 2.25 x 0.26 m	Volumen	3.67 m³
Ubicaciones	Logistik: 9 / Obra: 0	Hash pieza	03412B047924...8960557B
Hora operativa	Ubicación	Lector	Referencia
17/06/2026 07:36	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:36	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
...	...	...	...
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002
17/06/2026 07:37	LOGISTIK_PLASENCIA	CHAINWAY-MC51-72d090203c131e83	NRN.LOG-002

13. Conclusiones y recomendaciones

- La prueba valida que la trazabilidad por pieza es viable y aporta control útil en origen, destino, montaje y cierre documental.
- La información depurada permite reconstruir 29 activos con estado, ubicación normalizada, transporte asociado y certificación final.
- El seguimiento del camión aporta una capa adicional de control logístico; se recomienda extender esta cobertura a todos los viajes.
- La planificación de carga debe alinearse con la secuencia de montaje para reducir movimientos, tiempos de espera y verificaciones repetidas.
- Se recomienda incorporar alertas de tolerancia, digitalización de partes de proceso, optimización de cargas, seguimiento continuo de transporte, organización de montaje y conexión con el ERP de empresa.

14. Anexos técnicos

14.1 Hash master y control de integridad

Hash master de la escritura digital: A2F5345C00E145B79BC88AC16B1F5DD887250A9581885866073CE0A5DD80545C

14.2 Lectores considerados

- Samsung SM-A165F
- CHAINWAY MC51
- CHAINWAY URA4
- R1

14.3 Criterios de datos no disponibles

ND indica dato no disponible o no aplicable dentro de la cobertura real de la prueba. No se rellenan horas de descarga de viajes 4 y 5 por no disponer de lectura o nota válida de descarga. Las piezas del camión 5 se certifican el 22/06/2026 sin hora detallada.
